



ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA  
KANTONA SARAJEVO

**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKATA IZ PROGRAMA JAVNIH  
INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO 2020-2022. NA DAN 30.06.2019. GODINE**

**Direktor:**

---

Hamdija Efendić, dipl.ing.građ.

Sarajevo, oktobar/listopad 2019. godine

**ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO**

[www.zavodzpr-sa.ba](http://www.zavodzpr-sa.ba)

**Direktor:**

**Hamdija Efendić, dipl.ing.grad.**

Koordinacija i obrada:

**SEKTOR ZA PLANIRANJE DRUŠTVENO-EKONOMSKOG RAZVOJA**

e-mail: [ecc\\_sektor@zavodzpr-sa.ba](mailto:ecc_sektor@zavodzpr-sa.ba)

Pomoćnik direktora za planiranje društveno ekonomskog razvoja:

mr.sc. Maida Fetahagić

Šef službe za upravljanje projektima KS:

Ermina Čatić, dipl. ecc.

Šef službe za istraživanje i razvoj:

Emina Kašmo, dipl.ecc.

Priprema i obrada:

Ermina Čatić, dipl.ecc.

Feriha Uzunović, dipl.ecc.

Edin Trgo, ee

## Sadržaj

<b>Uvod</b> .....	3
1. Projekti u implementaciji iz PJI KS 2020.-2022 sa realizacijom 30.06.2019. godine .....	4
2. Projekti prema strukturi i načinu finansiranja.....	11
<b>Zaključak</b> .....	13

## Uvod

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo je u saradnji sa resornim ministarstvima Kantona Sarajevo pripremio „Izvještaj o realizaciji projekata iz Programa javnih investicija Kantona Sarajevo 2020-2022. na dan 30.06.2019. godine“(u daljem tekstu Izvještaj).

Cilj Izvještaja je informisati Vladu Kantona Sarajevo o realizaciji projekata iz Programa javnih investicija KS.

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo u saradnji sa resornim ministarstvima Kantona Sarajevo i općinama pripremio je izvještaj o realizaciji sa presjekom 30.06.2019. godine.

U više navrata Zavod je upućivao urgencije za dostavu podataka.

Sva ministarstva su dostavila projekte u implementacije sa realizacijom 30.06.2019. godine, a zadnji projekti su dostavljeni 02.10.2019. godine.

Izvještaj daje presjek realizacije projekata u implementaciji zaključno sa 30.06.2019. godine kao i realizaciju za cijeli investicioni period.

Izvještaj se sastoji iz dva djela:

1. Projekti u implementaciji sa realizacijom 30.06.2019. godine,
2. Projekti prema strukturi i načinu finansiranja.

Izvještaj obuhvata ukupno 60 projekata u implementaciji, od toga je 54 iz nadležnosti ministarstava i 6 projekata iz nadležnosti općina.

## 1. Projekti u implementaciji iz PJI KS 2020.-2022 sa realizacijom 30.06.2019. godine

Od vrijednosti projekata u implementaciji u ministarstvima 618.771.324 KM u investicionom periodu realizovano je 140.475.533 KM ili 22,7%. Od vrijednosti projekata u implementaciji po općinama 33.208.275 KM u investicionom periodu realizovano je 8.004.242 KM ili 24,1%.

Od ukupne vrijednosti projekata u implementaciji u ministarstvima planirano je za 2019. godinu 175.610.945 KM, od čega je na dan 30.06.2019. godine realizovano 5.019.610 KM ili 2,9%. U općinama je za 2019. godinu planirano 10.022.539 KM, od čega je na dan 30.06.2019. godine realizovano 6.984.582 KM ili 69,7 %.

Za nastavak realizacije projekata u implementaciji u 2020. godini potrebno je obezbjediti ukupno 65.701.260 KM za ministarstva, dok je za općine potrebno 4.750.000 KM. Nedostajuća sredstva iznose 71.914.052 KM.

U narednim tabelama daje se pregled svih projekata (u implementaciji) sa stepenom ukupne realizacije (u investicionom periodu) i stepenom realizacije u prvoj polovini 2019. godine.

Tabela 1. Pregled projekata u implementaciji po ministarstvima, u KM

Podnositelj	R.b	Naziv projekta	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.-30.06.2019.	Ukupno realizovano	Stepen ukupne realizacije u %	Stepen ukupne realizacije u 2019 u %	Nedostajuća sredstva	Plan			Naredni period
											2020	2021	2022	
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade	1	Rekonstrukcija vrtića "Razigrani dani"	800.000		800.000									
	2	Projekat energetske efikasnosti u osnovnim i srednjim školama	2.507.005	130.000	1.477.005	745.247	875.247	34,9	50,5		300.000	300.000	300.000	
	3	Izgradnja i opremanje objekata nove sportske sale OŠ "Umihana Čuvidina"	5.200.000	2.500.000	1.000.000		2.500.000	48,1			1.000.000	700.000		
	4	Sufinansiranje izgradnje JU OŠ "Zaim Kolar"-škola u prirodi, Šabići	1.530.000	1.230.000	300.000		1.230.000	80,4						
	5	Nabavka opreme za realizaciju Projekata "Elektronski dnevnik"	5.099.000	1.100.000	999.000		1.100.000	21,6			1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	6	Sufinansiranje osnovne škole na Šipu	11.500.000	4.137.393	2.362.607		4.137.393	36,0			2.000.000	3.000.000		
	7	Sufinansiranje izgradnje i opremanja sale za tjelesni	1.050.000	650.000	400.000		650.000	61,9						

Podnositelj	R.b	Naziv projekta	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.-30.06.2019.	Ukupno realizovano	Stepen ukupne realizacije u %	Stepen ukupne realizacije u 2019 u %	Nedostajuća sredstva	Plan			Naredni period
											2020	2021	2022	
		odgoj u JU SC "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš												
	8	Izgradnja Univerzitetske biblioteke	39.851.405	1.502.584	619.803	140.228	1.642.812	4,1	22,6	34.729.018	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	9	Izgradnja Akademije scenskih umjetnosti-II faza	5.999.000	1.669.519	2.829.481		1.669.519	27,8			1.500.000			
	10	Rekonstrukcija bazena na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu	3.236.000	3.136.000	100.000		3.136.000	96,9						
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade			76.772.410	16.055.496	10.887.896	885.475	16.940.971	22,1	8,1	34.729.018	6.800.000	6.000.000	2.300.000	
Ministarstvo zdravstva KS	1	Rekonstrukcija objekta Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS i specifikacija potrebne opreme	2.747.964	259.572	660.000		259.572	9,4		540.000	300.000	60.000	928.392	
	2	Rekonstrukcija i sanacija centralnog objekta JU zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo	3.050.000		50.000						1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	3	Rekonstrukcija doma zdravlja Kumrovec	8.273.629	7.282.690	990.939	210.198	7.492.888	90,6	21,2					
	4	Zanavljanje dotrajale medicinske i nemedicinske opreme u JU Dom zdravlja KS	3.530.000	2.938.160	591.840	228.110	3.166.270	89,7	38,5					
	5	Adaptacija i renoviranje objekata OII za smještaj odjela Pedijatrije u prizemlju J.U. Opća Bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš"	2.200.000	96.070	2.103.930	290.877	386.947	17,6	13,8					
	6	Nabavka medicinske opreme za potrebe Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu	4.991.000	1.366.000	1.825.000		1.366.000	27,4			800.000	1.000.000		
	7	Nabavka medicinske i nemedicinske opreme za potrebe J.U. Opća Bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš"	5.380.000	3.700.000	280.000		3.700.000	68,8			700.000	700.000		
Ministarstvo zdravstva KS			30.172.593	15.642.492	6.501.709	729.185	16.371.677	54,3	11,2	540.000	2.800.000	2.760.000	1.928.392	

Podnositelj	R.b	Naziv projekta	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.-30.06.2019.	Ukupno realizovano	Stepen ukupne realizacije u %	Stepen ukupne realizacije u 2019 u %	Nedostajuća sredstva	Plan			Naredni period
											2020	2021	2022	
Ministarstvo privrede	1	Projekat opremanja prihvatilišta pasa lotalica	<b>3.013.230</b>	<b>50.000</b>	<b>963.230</b>		<b>50.000</b>	<b>1,7</b>			<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		
	2	Provođenje šumsko-uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma na području Kantona Sarajevo za 2018. godinu - kapitalni projekti iz šumarstva	<b>22.105.873</b>	<b>3.105.873</b>	<b>4.500.000</b>		<b>3.105.873</b>	<b>14,0</b>			<b>4.500.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	
	3	Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u industrijskim zonama Kantona Sarajevo	<b>16.152.000</b>		<b>3.640.000</b>						<b>3.756.000</b>	<b>3.756.000</b>	<b>5.000.000</b>	
	4	Sanacija piste za brzo klizanje na Zetri	<b>7.497.000</b>	<b>2.497.000</b>			<b>2.497.000</b>	<b>33,3</b>			<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>		
	5	Rekonstrukcija startnog objekta na vrhu Bjelašnice	<b>2.200.000</b>	<b>421.200</b>			<b>421.200</b>	<b>19,1</b>			<b>1.778.800</b>			
<b>Ministarstvo privrede</b>			<b>50.968.103</b>	<b>6.074.073</b>	<b>9.103.230</b>		<b>6.074.073</b>	<b>11,9</b>			<b>13.534.800</b>	<b>12.256.000</b>	<b>10.000.000</b>	
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	1	Implementacija Plana upravljanja otpadom Kantona Sarajevo	<b>13.867.753</b>	<b>8.867.753</b>	<b>2.000.000</b>	<b>264.257</b>	<b>9.132.010</b>	<b>65,9</b>	<b>13,2</b>		<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		
	2	Predinvestiranje u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa i izgradnji primarne materijalne infrastrukture za pokretanje individualne i kolektivne stambene izgradnje u skladu sa prostorno planskom dokumentacijom na području KS	<b>17.817.088</b>	<b>14.062.588</b>			<b>14.062.588</b>	<b>78,9</b>		<b>3.154.500</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	
	3	Povećanje energetske efikasnosti u stambenim zgradama Kantona Sarajevo	<b>12.130.311</b>	<b>7.881.657</b>	<b>2.148.654</b>		<b>7.881.657</b>	<b>65,0</b>			<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	
	4	Unapređenje sistema monitoringa kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo	<b>981.528</b>	<b>181.528</b>			<b>181.528</b>	<b>18,5</b>				<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>
	5	Povećanja energetske efikasnosti u objektima budžetskih korisnika	<b>9.373.643</b>	<b>1.194.278</b>	<b>6.179.365</b>	<b>358.897</b>	<b>1.553.175</b>	<b>16,6</b>	<b>5,8</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		

Podnositelj	R.b	Naziv projekta	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.-30.06.2019.	Ukupno realizovano	Stepen ukupne realizacije u %	Stepen ukupne realizacije u 2019 u %	Nedostajuća sredstva	Plan			Naredni period
											2020	2021	2022	
	6	Sanacija ratnim dejstvima oštećenih krovova	13.000.756	12.840.756	10.000		12.840.756	98,8			50.000	50.000	50.000	
	7	Sredstva za sanaciju ratnim dejstvima oštećenih liftova	3.128.429	2.863.429	85.000		2.863.429	91,5			60.000	60.000	60.000	
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša			70.299.508	47.891.989	10.423.019	623.154	48.515.143	69,0	6,0	3.154.500	4.010.000	3.210.000	1.210.000	400.000
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture	1	Javna punionica vozila na komprimirani prirodni gas (CNG)	2.000.000		2.000.000	1.388.385	1.388.385	69,4	69,4					
	2	Subvecioniranje troškova rekonstrukcije unutrašnjih gasnih instalacija	1.101.000	441.386	609.614		441.386	40,1			50.000			
	3	Uvezan gasni prsten na dionici Hrasnica-Igman-Bjelašnica-Hadžići	2.501.000	487.029	2.013.971	354.767	841.796	33,7	17,6					
	4	Povećanje kapaciteta za ukop/sahranu na groblju "Vlakovo"-proširenje groblja "Vlakovo"	4.247.210	6.903	633.404	33.404	40.307	0,9	5,3	6.903	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
	5	Povećanje kapaciteta za ukop/sahranu na groblju "Vlakovo"-kompleks krematorija i komemorativnog centra Sarajevo	4.110.000	64.793	241.550	241.550	306.343	7,5	100,0	150.000	3.653.657			
	6	Povećanje kapaciteta za ukop/sahranu na groblju "Vlakovo"-proširenje parkinga	902.999	7.986	388.778	6.235	14.221	1,6	1,6	6.235	500.000			
	7	Sanacija prioriternih dijelova vodovodnog sistema- I tranša kredita EBRD	40.000.000		20.000.000						10.000.000	10.000.000		
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture			54.862.209	1.008.097	25.887.317	2.024.341	3.032.438	5,5	7,8	163.138	15.403.657	11.200.000	1.200.000	
Ministarstvo unutrašnjih poslova	1	Nabavka opreme	44.616.354	35.480.378	9.135.976	41.096	35.521.474	79,6	0,4					
	2	Dogradnja i adaptacija IV plicijske uprave MUP-a KS, PS Novi Grad	1.000.000		600.000						400.000			
			45.616.354	35.480.378	9.735.976	41.096	35.521.474	77,9	0,4		400.000			



Podnositelj	R.b	Naziv projekta	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.-30.06.2019.	Ukupno realizovano	Stepen ukupne realizacije u %	Stepen ukupne realizacije u 2019 u %	Nedostajuća sredstva	Plan			Naredni period
											2020	2021	2022	
Ministarsvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice	1	Izgradnja objekta KJU "Porodično savjetovalište"	2.635.631	1.803.462	801.559	212.212	2.015.674	76,5	26,5	30.610				
Ministarsvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice			2.635.631	1.803.462	801.559	212.212	2.015.674	76,5	26,5	30.610				
Ministartvo saobraćaja - Direkcija za ceste KS	1	Izgradnja i rekonstrukcija I transverzale-Dionica II (od IV do X transverzale; km2+580,150 do 5+616,20)	25.347.557		20.000.000					5.347.557				
	2	Moderizacija sistema urbanih saobraćajnica u Kanotonu Sarajevo Izgradnjom i rekonstrukcijom IX transverzale	24.999.229		21.000.000					3.999.229				
	3	Izgradnja i rekonstrukcija I transverzale-Dionica I (Krančevića-Velešići; km 0+000 do 0+800)	29.200.000	7.200.000	22.000.000		7.200.000	24,7						
	4	Izgradnja i rekonstrukcija I transvezale-Dionica II (Bare-Tunel Kobilja Glava-Hotonj; Km 2+200 do 5+200)	42.708.028		22.708.028					20.000.000				
	5	Izgradnja i rekonstrukcija IX transverzale	570.427		340.417	340.417	340.417	59,7	100,0		47.666	132.343	50.000	
Ministartvo saobraćaja - Direkcija za ceste KS			122.825.241	7.200.000	86.048.445	340.417	7.540.417	6,1	0,4	29.346.786	47.666	132.343	50.000	
Ministartvo saobraćaja	1	Projekat obnove voznog parka za javni linijski prevoz putnika	56.400.000									32.737.450	23.662.550	
	2	Izgradnja garaže na Babinom dolu - Bjelašnica	1.900.000	1.500.000	400.000		1.500.000	78,9						
	3	Projekat izgradnje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu	12.164.330		7.115.064						2.524.633	2.524.633		
	4	Javna podzemna garaža G3 u ulici Kolodvorska, Općina Novo Sarajevo	5.500.000		4.000.000						1.000.000	500.000		
	5	Adaptivno upravljanje saobraćajem	8.000.000		2.000.000						3.000.000	3.000.000		

Podnositelj	R.b	Naziv projekta	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.-30.06.2019.	Ukupno realizovano	Stepen ukupne realizacije u %	Stepen ukupne realizacije u 2019 u %	Nedostajuća sredstva	Plan			Naredni period
											2020	2021	2022	
	6	Projekat sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu	46.740.027		83.730	83.730	83.730	0,2	100,0		15.552.099	15.552.099	15.552.099	
	7	Povećanje kapaciteta za prevoz putnika izgradnja tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica	17.668.467	118.467	2.000.000		118.467	0,7		2.000.000	2.000.000	5.800.000	5.750.000	
Ministartvo saobraćaja			148.372.824	1.618.467	15.598.794	83.730	1.702.197	1,1	0,5	2.000.000	24.076.732	60.114.182	44.964.649	
Ministarstvo za boračka pitanja	1	Izgradnja centralnog spomenika svim poginulim braniteljima opkoljenog Sarajeva	962.000	100.000	80.000	80.000	180.000	18,7	100,0		300.000	300.000	182.000	
Ministarstvo za boračka pitanja			962.000	100.000	80.000	80.000	180.000	18,7	100,0		300.000	300.000	182.000	
Ministarstvo za boračka pitanja-Fond memorijala	1	Izrada i postavljanje nišana i spomenika šehidima i poginulim borcima i umrlim braniteljima	2.125.348	532.348	393.000		532.348	25,0			400.000	400.000	400.000	
	2	Izgradnja kompleksa "Šehidsko spomen mezarije Kovači"	13.159.121	10.199.121	150.000		10.199.121	77,5		1.950.000	170.000	150.000	110.000	430.000
Ministarstvo za boračka pitanja-Fond memorijala			15.284.469	10.731.469	543.000		10.731.469	70,2		1.950.000	570.000	550.000	510.000	430.000
UKUPNO			618.771.342	143.605.923	175.610.945	5.019.610	140.475.533	22,7	2,9	71.914.052	65.701.260	96.522.525	64.586.636	830.000

Tabela 2. Pregled projekata u implementaciji po općinama, u KM

Podnositelj	R.b	Naziv projekta	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.-30.06.2019.	Ukupno realizovano	Stepen ukupne realizacije u %	Stepen ukupne realizacije u 2019 u %	Nedostajuća sredstva	Plan			Naredni period
											2020	2021	2022	
Oćina Stari Grad	1	Nadogradnja i utopljavljanje Doma zdravlja Stari Grad	<b>1.922.850</b>		<b>1.922.850</b>	<b>634.036</b>	<b>634.036</b>	<b>33,0</b>	<b>33,0</b>					
Oćina Stari Grad	2	Poboljšanje energetske efikasnosti zgrada administracije Općine Stari Grad Sarajevo	<b>1.976.172</b>		<b>1.976.172</b>	<b>626.129</b>	<b>626.129</b>	<b>31,7</b>	<b>31,7</b>					
Oćina Stari Grad	3	Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u djelovima ulice Budakovići	<b>402.000</b>	<b>138.000</b>	<b>264.000</b>		<b>138.000</b>	<b>34,3</b>						
Oćina Stari Grad	4	Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u djelovima ulica Kamenica-Paje	<b>550.000</b>	<b>414.900</b>	<b>135.100</b>		<b>414.900</b>	<b>75,4</b>						
Općina Ilijaš	5	Izgradnja sistema vodosnadbjevanja MZ Gajevi sa izvorišta Vrutak	<b>1.807.253</b>	<b>466.760</b>	<b>774.417</b>	<b>774.417</b>	<b>1.241.177</b>	<b>68,7</b>	<b>100,0</b>			<b>283.038</b>	<b>283.038</b>	
Općina Trnovo	6	Izgradnja Poslovno-sportskog centra Trnovo	<b>26.550.000</b>		<b>4.950.000</b>	<b>4.950.000</b>	<b>4.950.000</b>	<b>18,6</b>	<b>100,0</b>		<b>4.750.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>6.850.000</b>	
		<b>Ukupno</b>	<b>33.208.275</b>	<b>1.019.660</b>	<b>10.022.539</b>	<b>6.984.582</b>	<b>8.004.242</b>	<b>24,1</b>	<b>69,7</b>		<b>4.750.000</b>	<b>10.283.038</b>	<b>7.133.038</b>	


## 2. Projekti prema strukturi i načinu finansiranja

U 2019. godini do 30.06.2019. realizirano je 12.004.192 KM ili 6,5% planiranih investicija, od toga su domaća sredstva 9.278.698 KM ili 77,3% a ino sredstava 2.725.494 ili 22,7% iz nadležnosti ministarstava i općina. Ukupan stepen realizacije se ocjenjuje sa 22,8%, gdje je u strukturi jako nizak stepen realizacije inostranih sredstava 4,7%. Od ukupne realizacije projekata 148.479.775 KM realizovano je domaćih sredstava 140.614.625 KM (94,7%), a ino sredstava 7.865.150 (15,3%).

Tabela 13. Pregled ulaganja u projekte u implementaciji po strukturi finansiranja, u KM

Vrsta	Izvor finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Realizovano od 01.01.-30.06.2019.	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	Plan			Naredni period
								2020	2021	2022	
Ino	Grant	37.010.146	3.860.484	471.668	478.700	4.339.184	32.677.994				
	Donacija	133.971	133.971			133.971					
	Kredit	128.942.572	1.145.201	37.174.998	2.246.794	3.391.995	20.000.000	25.835.137	29.235.137	15.552.099	
Ukupno ino		166.086.689	5.139.656	37.646.666	2.725.494	7.865.150	52.677.994	25.835.137	29.235.137	15.552.099	
Domaća	Budžet KS	399.807.368	109.588.904	128.497.219	4.219.754	105.958.658	16.222.920	34.286.323	62.865.426	48.132.575	214.000
	Budžet Općina i dr.	42.458.929	9.721.434	9.612.495	3.572.151	13.293.585		5.125.000	11.075.000	6.925.000	
	Kredit	27.408.302	10.622.016	7.007.486	745.247	11.367.263	3.000.000	4.278.800	2.500.000		
	Grant	10.219.152	7.455.196	663.956	153.912	7.309.108		700.000	700.000	700.000	
	Sredstva fonda	981.528	181.528			181.528			200.000	200.000	400.000
	Vlastiti prihodi	4.751.587	1.675.787	2.180.662	587.634	2.263.421	13.138	226.000	230.000	210.000	216.000
	Primitak	266.062	241.062	25.000		241.062					
Ukupno domaća		485.892.928	139.485.927	147.986.818	9.278.698	140.614.625	19.236.058	44.616.123	77.570.426	56.167.575	830.000
Ukupno tekući projekti		651.979.617	144.625.583	185.633.484	12.004.192	148.479.775	71.914.052	70.451.260	106.805.563	71.719.674	830.000


Način finansiranja projekata u implementaciji

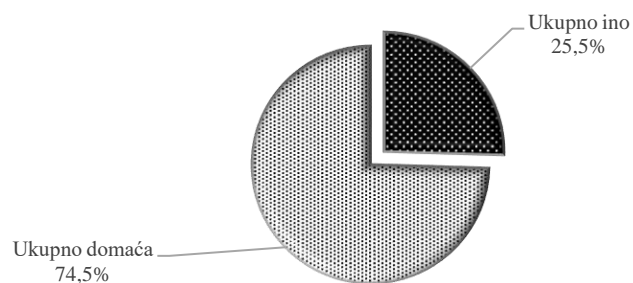

Graf 1.

U strukturi finansiranja tekućih projekata dominiraju domaća sredstva sa 485.892.928 KM ili 74,5% učešća u ukupnoj vrijednosti projekata. Ino sredstva u vrijednosti 166.086.689 KM čine 25,5%.

Učešće domaćih i ino sredstava u realizaciji u 2019. godini

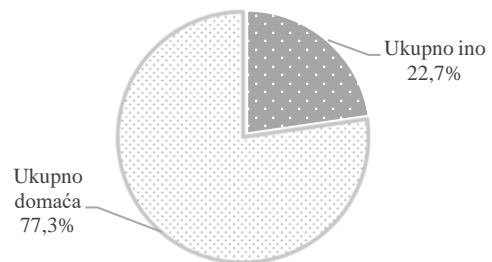

U 2019. godini od ukupne realizacije projekata 12.004.192 KM realizovano je domaćih sredstava 9.278.698 KM (77,3%) i ino sredstava 2.725.494 KM (22,7%).

Graf 2.

## Zaključak

Od vrijednosti projekata u implementaciji 684.332.310 KM u investicionom periodu realizovano je 148.479.775 KM ili 22,8%, gdje je stepen realizacije u općinama nešto veći.

Za 2019. godinu planirana je realizacija u vrijednosti od 185.633.484 KM projekata u implementaciji, od čega je na dan 30.06.2019. godine realizovano 12.004.192 KM ili 6,5%. Stepen realizacije projekata u iz nadležnosti ministarstava je iznimno nizak 2,9%.

Ministarstvo unutrašnjih poslova ima najveći stepen realizacije projekata u investicionom periodu, gdje je od 45.616.354 KM realizovano 35.521.474 KM ili 77,9%. No, od planirane vrijednosti za 2019. godinu 9.735.976 KM, a na dan 30.06.2019. godine realizovano svega 41.096 KM ili 0,4%.

Ministarstvo za boračka pitanja je realizaciju na dan 30.06.2019. godine 80.000 KM ili 100,0% od planirane vrijednosti za 2019. godinu u iznosu od 80.000 KM, pa Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice 212.212 KM ili 26,5% od planirane vrijednosti za 2019. godinu u iznosu od 801.559 KM.

Projekti koji nisu nastavili sa realizacijom u 2019. godini:

- Iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade su sledeći projekti:
  1. Izgradnja i opremanje objekata nove sportske sale OŠ "Umihana Čuvidina"
  2. Sufinansiranje izgradnje JU OŠ "Zaim Kolar"-škola u prirodi, Šabići
  3. Nabavka opreme za realizaciju Projekata "Elektronski dnevnik"
  4. Sufinansiranje osnovne škole na Šipu
  5. Sufinansiranje izgradnje i opremanja sale za tjelesni odgoj u JU SC "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš
  6. Izgradnja Akademije scenskih umjetnosti-II faza
  7. Rekonstrukcija bazena na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
- Iz Ministarstva zdravstva su sledeći projekti:
  1. Rekonstrukcija objekta Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS i specifikacija potrebne opreme
  2. Nabavka medicinske opreme za potrebe Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu
  3. Nabavka medicinske i nemedicinske opreme za potrebe J.U. Opća Bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš"
- Iz Ministarstva privrede su sledeći projekti:
  1. Projekat opremanja prihvatilišta pasa lotalica
  2. Provođenje šumsko-uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma na području Kantona Sarajevo za 2018. godinu - kapitalni projekti iz šumarstva
  3. Sanacija piste za brzo klizanje na Zetri

4. Rekonstrukcija startnog objekta na vrhu Bjelašnice

- Iz Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša su sledeći projekti:

1. Predinvestiranje u rješavanju imovinsko pravnih odnosa i izgradnji primarne materijalne infrastrukture za pokretanje individualne i kolektivne stambene izgradnje u skladu sa prostorno planskom dokumentacijom na području KS
2. Povećanje energetske efikasnosti u stambenim zgradama Kantona Sarajevo
3. Unapređenje sistema monitoringa kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo
4. Sanacija ratnim dejstvima oštećenih krovova
5. Sredstva za sanaciju ratnim dejstvima oštećenih liftova

- Iz Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture su sledeći projekti:

1. Subvecioniranje troškova rekonstrukcije unutrašnjih gasnih instalacija

- Iz Ministarstva saobraćaja – Direkcije za ceste su sledeći projekti:

1. Izgradnja i rekonstrukcija I transverzale-Dionica I (Krančevića-Velešići; km 0+000 do 0+800)

- Iz Ministarstva saobraćaja su sledeći projekti:

1. Izgradnja garaže na Babinom dolu - Bjelašnica
2. Povećanje kapaciteta za prevoz putnika izgradnja tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica

- Iz Ministarstva za boračka pitanja – Fond memorijala su sledeći projekti:

1. Izrada i postavljanje nišana i spomenika šehidima i poginulim borcima i umrlim braniteljima
2. Izgradnja kompleksa "Šehidsko spomen mezarije Kovači"

- Iz Općine Stari grad su sledeći projekti:

1. Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u djelovima ulice Budakovići
2. Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u djelovima ulica Kamenica-Paje

Osim toga, projekti koji nisu počeli sa realizacijom su:

- Iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade su sledeći projekti:

1. Rekonstrukcija vrtića "Razigrani dani"

- Iz Ministarstva zdravstva su sledeći projekti:

1. Rekonstrukcija i sanacija centralnog objekta JU zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo

- Iz Ministarstva privrede su sledeći projekti:
  1. Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u industrijskim zonama Kantona Sarajevo
- Iz Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture su sledeći projekti:
  1. Sanacija prioriternih dijelova vodovodnog sistema- I tranša kredita EBRD
- Iz Ministarstva unutrašnjih poslova su sledeći projekti:
  1. Dogradnja i adaptacija IV plicijske uprave MUP-a KS, PS Novi Grad
- Iz Ministarstva saobraćaja – Direkcije za ceste su sledeći projekti:
  1. Izgradnja i rekonstrukcija I transverzale-Dionica II (od IV do X transverzale; km2+580,150 do 5+616,20)
  2. Modernizacija sistema urbanih saobraćajnica u Kanotonu Sarajevo Izgradnjom i rekonstrukcijom IX transverzale
  3. Izgradnja i rekonstrukcija I transvezale-Dionica II (Bare-Tunel Kobilja Glava-Hotonj; Km 2+200 do 5+200)
- Iz Ministarstva saobraćaja su sledeći projekti:
  1. Projekat obnove voznog parka za javni linijski prevoz putnika
  2. Projekat izgradnje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu
  3. Javna podzemna garaža G3 u ulici Kolodvorska, Općina Novo Sarajevo
  4. Adaptivno upravljanje saobraćajem

Posebno treba istaći da je implementacija mnogih projekata vezana za zahtjevne procedure javnih nabavki. Praktično takvi projekti nemaju finansijsku realizaciju, ali su se počeli implementirati.

Od ukupne realizacije projekata 148.479.775 KM realizovano je domaćih sredstava 140.614.625 KM (94,7%), a ino sredstava 7.865.150 (15,3%).

U 2019.godini do 30.06.2019. realizirano je 12.004.192 KM ili 6,5% planiranih investicija, od toga su domaća sredstva 9.278.698 KM ili 77,3% a ino sredstava 2.725.494 ili 22,7% iz nadležnosti ministarstava i općina.
