



ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA  
KANTONA SARAJEVO

**IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROJEKATA IZ PROGRAMA JAVNIH  
INVESTICIJA KANTONA SARAJEVO 2022-2024. NA DAN 31.12.2021. GODINE**

**Direktor:**

---

Faruk Muharemović, Mr.dipl.ing.arh.

Sarajevo, april/travanj 2022. godine

**ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO**

www.zavodzpr-sa.ba

**Direktor:**

**Faruk Muharemović, Mr.dipl.ing.arh.**

Koordinacija i obrada:

**SEKTOR ZA PLANIRANJE DRUŠTVENO-EKONOMSKOG RAZVOJA**

e-mail: ecc\_sektor@zavodzpr-sa.ba

Pomoćnik direktora za planiranje društveno ekonomskog razvoja:

Ermina Ćatić, dipl. ecc.

Šef službe za istraživanje i razvoj:

Emina Kašmo, dipl.ecc.

Priprema i obrada:

Ermina Ćatić, dipl.ecc.

Feriha Uzunović, dipl.ecc.

Edin Trgo, ee

## Sadržaj

<b>Uvod .....</b>	<b>3</b>
1. Projekti u implementaciji iz PJI KS 2022-2024. sa realizacijom 31.12.2021. godine .....	4
2. Projekti prema strukturi i načinu finansiranja.....	13
<b>Zaključak.....</b>	<b>14</b>

## Uvod

Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-04-37843-18/21 zadužuje se Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo da u saradnji sa resornim ministarstvima Kantona Sarajevo pripremi „Izveštaj o realizaciji projekata iz Programa javnih investicija Kantona Sarajevo 2022-2024. na dan 31.12.2021. godine“(u daljem tekstu Izveštaj).

Cilj Izveštaja je informisati Vladu Kantona Sarajevo o realizaciji projekata iz Programa javnih investicija KS.

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo u saradnji sa resornim ministarstvima Kantona Sarajevo, općinama i Gradom Sarajevo pripremio je izvještaj o realizaciji sa presjekom 31.12.2021. godine.

U više navrata Zavod je upućivao urgencije za dostavu podataka.

Sva ministarstva su dostavila projekte u implementacije sa realizacijom 31.12.2021. godine, a zadnji projekti su dostavljeni 2022. godine.

Izveštaj daje presjek realizacije projekata u implementaciji zaključno sa 31.12.2021. godine kao i realizaciju za cijeli investicioni period.

Izveštaj se sastoji iz dva djela:

1. Projekti u implementaciji sa realizacijom 31.12.2021. godine,
2. Projekti prema strukturi i načinu finansiranja.

## 1. Projekti u implementaciji iz PJI KS 2022-2024. sa realizacijom 31.12.2021. godine

U Izvještaju su uključeni projekti koji su u implementaciji i čija realizacija je počela prije 2021. godine i projekti čija se realizacija nastavlja. Ukupna vrijednost svih projekata u implementaciji po ministarstvima kojih ima 53, iznosi 782.760.034 KM, a po općinama i Gradu Sarajevo kojih ima 17, iznosi 65.985.009 KM.

Od vrijednosti projekata u implementaciji po ministarstvima 782.760.034 KM u investicionom periodu realizovano je 213.739.440 KM ili 27,3%, a od vrijednosti projekata u implementaciji po općinama 65.985.009 KM u investicionom periodu realizovano je 17.196.640 KM ili 26,1%. Od ukupne vrijednosti projekata u implementaciji po ministarstvima planirano je za 2021. godinu 108.398.187 KM, od čega je na dan 31.12.2021. godine realizovano 74.170.119 KM ili 68,4%, dok je u općinama i Gradu za 2021. godinu planirano 9.085.820 KM, od čega je na dan 31.12.2021. godine realizovano 4.987.820 KM ili 54,9 %.

Za nastavak realizacije projekata u implementaciji po ministarstvima u 2022. godini potrebno je obezbjediti ukupno 243.633.372 KM, dok je po općinama i Gradu potrebno obezbjediti 14.605.369 KM.

U narednim tabelama daje se pregled svih projekata (u implementaciji) sa stepenom ukupne realizacije (u investicionom periodu) i stepenom realizacije u toku 2021. godine.

Tabela 1. Pregled projekata u implementaciji po ministarstvima, u KM

Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2022	2023	2024	Plan za naredni period
KS Ministarstvo za boračka pitanja	Izgradnja kompleksa "Šehidsko spomen mezarje Kovači" Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet FBiH - Sufinansiranje projekata	Budžet	500.000	500.000			500.000					
			Budžet FBiH - javne investicije	Budžet	7.473.000	5.523.000			5.523.000	1.950.000				
			Budžet FBiH - potrošačka jedinica	Grant	10.000	10.000			10.000					
			Budžet kantona - javne investicije	Kredit	2.233.321	2.233.221	100		2.233.221					
			Budžet općine - sufinansiranje	Grant	221.751	221.751			221.751					
			Fondovi vlastito učešće	Vlastita sredstva	1.954.953	1.055.808	70.000		1.055.808	407.145	162.000	150.000	110.000	
			Javno-privatno partnerstvo (JPP)	Grant	300.000	300.000			300.000					
			Općina budžet	Grant	255.000	255.000			255.000					
		Ostala domaća sredstva	Grant	94.557	94.557			94.557						
Ino sredstva	Turska (TR)	Grant	134.256	134.256				134.256						

Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2022	2023	2024	Plan za naredni period
		<b>Ukupno</b>			<b>13.176.838</b>	<b>10.327.593</b>	<b>70.100</b>		<b>10.327.593</b>	<b>2.357.145</b>	<b>162.000</b>	<b>150.000</b>	<b>110.000</b>	
	Izrada i postavljanje jedinstvenih nadgrobnih spomen obilježja za šehide/poginule borce i umrlim braniteljima Armije i MUP-a R BiH	Domaća sredstva	Budžet FBiH - javne investicije	Grant	18.500	18.500			18500					
Budžet kantona - javne investicije			Budžet	2.752.998	1.239.578	105.000	105.000	1.344.578	400.000	504.210	504.210			
			Kredit	477.000		477.000	373.584	373.584						
Budžet općine - sufinansiranje			Grant	532.500	292.500	15.000	45.000	337.500	75.000	75.000	75.000			
			Fondovi vlastito učešće	Vlastita sredstva	1.203.837	1.003.837	200.000	72.378	1.076.215					
		<b>Ukupno</b>			<b>4.984.835</b>	<b>2.554.415</b>	<b>797.000</b>	<b>595.962</b>	<b>3.150.377</b>		<b>475.000</b>	<b>579.210</b>	<b>579.210</b>	
	Izgradnja centralnog spomenika svim poginulim braniteljima opkoljenog Sarajeva	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	<b>1.182.000</b>	<b>100.000</b>	<b>40.755</b>	<b>40.755</b>	<b>140.755</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>891.245</b>
	Izgradnja memorijalnog centra „Žuč“	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	<b>3.549.653</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>3.099.653</b>
	Kupovina stanova za dodjelu u vlasništvo i na korištenje pripadnicima boračkih kategorija u skladu sa zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	<b>20.032.893</b>		<b>7.332.793</b>	<b>7.217.625</b>	<b>7.217.625</b>		<b>12.100.100</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	
		<b>UKUPNO</b>			<b>42.926.219</b>	<b>13.082.008</b>	<b>8.290.648</b>	<b>7.904.342</b>	<b>20.986.350</b>	<b>2.357.145</b>	<b>12.887.100</b>	<b>1.179.210</b>	<b>1.139.210</b>	<b>3.990.898</b>
Direkcija za puteve Kantona Sarajevo	Izgradnja i rekonstrukcija I transverzale – Dionica I (Kranjčevićeva – Velešići; km 0+000 do 0+800)	Domaća sredstva	Kanton - vlastito učešće	Budžet	<b>22.421.936</b>	<b>603.147</b>	<b>500.000</b>	<b>235.426</b>	<b>838.573</b>		<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>13.318.789</b>
	Izgradnja i rekonstrukcija I transverzale – Dionica II (Bare – Tunel Kobilja Glava - Hotonj; km 2+200 do 5+200)	Domaća sredstva	Kanton - vlastito učešće	Budžet	50.207.080	5.700.396	2.500.000	3.316.509	9.016.905		5.000.000	5.000.000	6.000.000	26.006.684
		Ino sredstva	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Kredit	60.000.000							10.000.000	10.000.000	40.000.000
		<b>Ukupno</b>			<b>110.207.080</b>	<b>5.700.396</b>	<b>2.500.000</b>	<b>3.316.509</b>	<b>9.016.905</b>		<b>5.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>66.006.684</b>
	Izgradnja i rekonstrukcija IX transverzale	Domaća sredstva	Kanton - vlastito učešće	Budžet	<b>15.550.266</b>	<b>9.299.837</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.787.095</b>	<b>11.086.932</b>		<b>2.000.000</b>	<b>1.750.429</b>		
	Izgradnja i rekonstrukcija Južne longitudinalne – Dionica II (od IV do X transverzale; km 2+580,150 do 5+616,20) do 5+616,20)	Domaća sredstva	Kanton - vlastito učešće	Budžet	<b>25.347.557</b>	<b>20.000.000</b>	<b>3.000.000</b>		<b>20.000.000</b>		<b>1.300.000</b>	<b>1.047.557</b>		
	Modernizacija sistema urbanih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo Izgradnjom i rekonstrukcijom Južne longitudinalne – dionica: od II do IV transverzale	Domaća sredstva	Kanton - vlastito učešće	Budžet	<b>24.999.229</b>	<b>3.999.229</b>	<b>4.000.000</b>		<b>3.999.229</b>		<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
		<b>UKUPNO</b>			<b>198.526.068</b>	<b>39.602.609</b>	<b>12.500.000</b>	<b>5.339.030</b>	<b>44.941.639</b>		<b>14.800.000</b>	<b>24.297.986</b>	<b>23.000.000</b>	<b>84.325.473</b>

Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2022	2023	2024	Plan za naredni period
Ministarstvo zdravstva	Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija JU Dom zdravlja KS u 2019.g.	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	59.763		59.763	59.763	59.763					
				Kredit	600.000		498.825	498.825	498.825	101.175				
	<b>Ukupno</b>				<b>659.763</b>		<b>558.588</b>	<b>558.588</b>	<b>558.588</b>		<b>101.175</b>			
	Nabavka medicinske opreme za potrebe Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	<b>6.768.129</b>	<b>1.968.171</b>	<b>4.799.958</b>	<b>119.516</b>	<b>2.087.687</b>					
	Rekonstrukcija objekta Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo i specifikacija potrebne opreme	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	<b>2.287.964</b>	<b>459.572</b>	<b>300.000</b>		<b>459.572</b>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>928.392</b>	
Rekonstrukcija i sanacija centralnog objekta JU zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	<b>3.045.000</b>	<b>45.000</b>	<b>1.000.000</b>		<b>45.000</b>		<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>			
<b>UKUPNO</b>				<b>12.760.856</b>	<b>2.472.743</b>	<b>6.658.546</b>	<b>678.104</b>	<b>3.150.847</b>		<b>1.401.175</b>	<b>1.300.000</b>	<b>928.392</b>		
KS Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade	Izgradnja Akademije scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu – II faza	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	4.549.000	500.000	2.549.000	781.047	1.281.047		500.000	500.000	500.000	
				Kredit	7.400.000	3.900.000	3.500.000	3.500.000	7.400.000					
	<b>Ukupno</b>				<b>11.949.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>6.049.000</b>	<b>4.281.047</b>	<b>8.681.047</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	
	„Rekonstrukcija, investiciono održavanje i opremanje objekta Fakulteta zdravstvenih studija UNSA,,	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	3.300.000		50.000	42.703	42.703		1.450.000	1.800.000		
			Ostala domaća sredstva	Budžet	2.000.000		2.000.000							
	Ino sredstva	Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP)	Grant		100.000						100.000			
<b>Ukupno</b>				<b>5.400.000</b>		<b>2.050.000</b>	<b>42.703</b>	<b>42.703</b>		<b>1.550.000</b>	<b>1.800.000</b>			
<b>UKUPNO</b>				<b>17.349.000</b>	<b>4.400.000</b>	<b>8.099.000</b>	<b>4.323.750</b>	<b>8.723.750</b>		<b>2.050.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>500.000</b>		
KS Ministarstvo za odgoj i obrazovanje	Nabavka opreme za realizaciju Projekta „Elektronski dnevnik“	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	1.499.000	1.199.000			1199000		300.000			
				Kredit	1.200.000	1.200.000			1200000					
	<b>Ukupno</b>				<b>2.699.000</b>	<b>2.399.000</b>			<b>2399000</b>		<b>300.000</b>			
	Projekat energetske efikasnosti uobrazovnim objektima na području Kantona Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	130.000	130.000				130000				
				Kredit	530.000		530.000							
	Ino sredstva	Svjetska banka - Međunarodna asocijacija za razvoj (WB IDA)	Kredit	1.477.005	1.477.005				1477005					
<b>Ukupno</b>				<b>2.137.005</b>	<b>1.607.005</b>	<b>530.000</b>		<b>1607005</b>						
Rekonstrukcija, investiciono održavanje i opremanje javnih ustanova iz oblasti obrazovanja	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	9.251.363	330.000	3.261.863	3.261.863	3.591.863		510.500	2.649.000	2.500.000		
			Kredit	3.955.000		55.000	41.590	41.590	3.900.000					
<b>Ukupno</b>				<b>13.206.363</b>	<b>330.000</b>	<b>3.316.863</b>	<b>3.303.453</b>	<b>3.633.453</b>		<b>4.410.500</b>	<b>2.649.000</b>	<b>2.500.000</b>		
Sufinansiranje izgradnje osnovne škole na Šipu	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	3.350.000	3.350.000				3350000					
			Kredit	4.705.000	3.505.000	1.200.000			3505000					
			Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	5.962.497	5.962.497				5962497				

Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2022	2023	2024	Plan za naredni period
	<b>Ukupno</b>				<b>14.017.497</b>	<b>12.817.497</b>	<b>1.200.000</b>		<b>12817497</b>					
	<b>UKUPNO</b>				<b>32.059.865</b>	<b>17.153.502</b>	<b>5.046.863</b>	<b>3.303.453</b>	<b>20.456.955</b>		<b>4.710.500</b>	<b>2.649.000</b>	<b>2.500.000</b>	
KS Ministarstvo privrede	Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u industrijsko-poslovnim zonama Kantona Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	1.259.479	1.256.186	3.293	3.293	1.259.479					
				Kredit	9.638.719	1.680.789	1.957.930	1.957.930	3.638.719	6.000.000				
		<b>Ukupno</b>				<b>10.898.198</b>	<b>2.936.975</b>	<b>1.961.223</b>	<b>1.961.223</b>	<b>4.898.198</b>	<b>6.000.000</b>			
	Provođenje šumsko-uzgojnih radova i radova na zaštiti šuma na području Kantona Sarajevo - kapitalni projekti iz šumarstva	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	13.742.077	4.957.434	824.643	824.643	5.782.077		3.980.000	3.980.000		
	Izgradnja mreže odvođenja tehnoloških, otpadnih i oborinskih voda i izgradnja prečišćivača otpadnih voda sa farme krava KJP „Poljoprivredno dobro Butmir“ d.o.o. Sarajevo-Ilidža	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	800.000	396.164	286.164	286.164	682.328		117.672			
	Projekat opremanja prihvatilišta pasa lualica	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	3.736.700	94.308	100.000		94.308		958.000	2.584.392		
	Projektovanje i nadogradnja sistema osnježenja na Bjelašnici- kompletna trasa gornje Kolijevke do međustanice, osnježenje platoa dolazne stanice šestosjeda sa postavljanjem "Tower" nosača na stazi "S	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	1.872.000		1.872.000	1.578.293	1.578.293					
	Izgradnja automatske garaže za sestosjed i zatvaranje dolazne stanice	Domaća sredstva	Budžet FBiH - javne investicije	Budžet	2.316.600	594.495	1.722.105		594.495					
	Izgradnja novog vertikalnog transporta (žičara) i rekonstrukcija postojećeg sistema na Bjelašnici i Igmanu	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	22.475.000	625.000	1.850.000		625.000		15.000.000	5.000.000		
	Rasvjeta staze -Bjelašnica	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	2.500.000		120.000	120.000	120.000		400.000	1.080.000	900.000	
Sanacija piste za brzo klizanje na Zetri druga i treća faza	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Grant	7.500.000	2.497.000			2.497.000		2.503.000	2.500.000			
	<b>UKUPNO</b>				<b>65.840.575</b>	<b>12.101.376</b>	<b>8.736.135</b>	<b>4.770.323</b>	<b>16.871.699</b>		<b>28.958.672</b>	<b>15.144.392</b>	<b>900.000</b>	
KS Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša	Energijiska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo	Domaća sredstva	Kanton - vlastito učešće	Budžet	3.027.331		471.665	14.730	14.730		2.229.519	326.147		
				Grant	6.121.748	48.896	1.471.915		48.896	3.855.922	745.015			
		Ino sredstva	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Kredit	15.646.640		1.736.777			12.345.199	1.564.664			
		<b>Ukupno</b>				<b>24.795.719</b>	<b>48.896</b>	<b>3.680.357</b>	<b>14.730</b>	<b>63.626</b>		<b>18.430.640</b>	<b>2.635.826</b>	
Povećanje energetske	Domaća	Budžet kantona -	Budžet	9.536.597	9.396.597	140.000	80.488	9.477.085						



Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2022	2023	2024	Plan za naredni period	
	efikasnosti u objektima budžetskih korisnika	sredstva	sufinansiranje												
			Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	1.593.618	1.593.618			1.593.618						
		Ino sredstva	Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP)	Grant	3.631.533	3.631.533		26.001	3.657.534						
	<b>Ukupno</b>					<b>14.761.748</b>	<b>14.621.748</b>	<b>140.000</b>	<b>106.489</b>	<b>14.728.237</b>					
	Povećanje energetske efikasnosti u stambenim zgradama u KS	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	2.741.157	2.741.157		15.000	2.756.157						
				Kredit	4.653.784	4.653.784			4653784						
			Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	418.462	418.462		40.000	458.462						
		Kanton - vlastito učešće	Budžet	2.344.394	619.894	494.500		619894		410.000	410.000	410.000			
		Ino sredstva	Europska unija (EU)	Grant				10.829	10.829						
	<b>Ukupno</b>					<b>10.157.797</b>	<b>8.433.297</b>	<b>494.500</b>	<b>65.829</b>	<b>8.499.126</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>		
Predinvestiranje u rješ. imov-pravnih odnosa i izgradnje primarne materijalne infr. za pokretanje kolektivne i individualne stambene izg. u skla. sa usvojenim pros.plan na području KS	Domaća sredstva	Kanton - vlastito učešće	Budžet	22.762.609	11.108.109	4.154.500		11108109		2.500.000	2.500.000	2.500.000			
			Ostala domaća sredstva	Budžet	3.573.149	3.573.149			3573149						
	<b>Ukupno</b>					<b>26.335.758</b>	<b>14.681.258</b>	<b>4.154.500</b>		<b>14681258</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>		
Sistemska sanacija objekata oštećenim ratnim dejstvima	Domaća sredstva	Kanton - vlastito učešće	Budžet	<b>869.092</b>			<b>356.182</b>	<b>164.453</b>	<b>164.453</b>		<b>170.970</b>	<b>170.970</b>	<b>170.970</b>		
	Rekonstrukcija vodovodne mreže putem KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	<b>2.000.000</b>			<b>255.966</b>	<b>255.966</b>	<b>255.966</b>		<b>1.744.034</b>			
	Rekonstrukcija vodozahvata Konaci I, Konaci II i rekonstrukcija laguna Konaci 2, Lužani 2 i Bačevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	<b>750.000</b>			<b>67.660</b>	<b>67.660</b>	<b>67.660</b>		<b>682.340</b>			
	Sanacija prioriternih dijelova vodovodnog sistema – I tranša kredita EBRD	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	3.400.000			3.029.329	3.029.329	3.029.329		370.671			
		Ino sredstva	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Kredit	20.000.000			17.222.465	17.222.465	17.222.465		2.777.535			
	<b>Ukupno</b>					<b>23.400.000</b>		<b>20.251.794</b>	<b>20.251.794</b>	<b>20.251.794</b>		<b>3.148.206</b>			
	Povećanje kapaciteta za ukop/sahranu na groblju "Vlakovo" - proširenje gradskog groblja "Vlakovo"	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	2.550.000	1.200.000	147.162	147.162	1.347.162		1.202.838				
				Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	236.896	130.247			130.247		106.649			
	<b>Ukupno</b>					<b>2.786.896</b>	<b>1.330.247</b>	<b>147.162</b>	<b>147.162</b>	<b>1.477.409</b>		<b>1.309.487</b>			
	Povećanje kapaciteta za ukop/sahranu na groblju «Vlakovo» - Komplex krematorija i komemorativnog	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	4.385.686	449.607			449.607		1.200.000	1.200.000	1.536.079		
				Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	414.314	379.131	35.183	35.183	414.314					

Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2022	2023	2024	Plan za naredni period
	centra Sarajevo													
	<b>Ukupno</b>				<b>4.800.000</b>	<b>828.738</b>	<b>35.183</b>	<b>35.183</b>	<b>863.921</b>		<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.536.079</b>	
	Povećanje kapaciteta za ukop/sahranu na groblju „Vlakovo“ – Proširenje parkinga	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	580.000	200.000			200.000		200.000	180.000		
			Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	319.310	271.543	47.767	47.767	319.310					
	<b>Ukupno</b>				<b>899.310</b>	<b>471.543</b>	<b>47.767</b>	<b>47.767</b>	<b>519.310</b>		<b>200.000</b>	<b>180.000</b>		
	Uređenje gradskog groblja Vlakovo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Kredit	<b>600.000</b>		<b>147.162</b>	<b>147.162</b>	<b>147.162</b>		<b>452.838</b>			
	"Poboljšanje komunalne higijene javno-prometnih površina u ljetno-zimskom periodu u Kantonu Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	<b>3.930.600</b>		<b>358.878</b>	<b>358.878</b>	<b>358.878</b>		<b>897.122</b>	<b>1.371.000</b>	<b>1.303.600</b>	
	"Uspostavljanje integrisanog upravljanja otpadom kroz sistem selektivnog prikupljanja otpada"	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	<b>7.020.000</b>		<b>231.445</b>	<b>231.445</b>	<b>231.445</b>		<b>3.021.891</b>	<b>1.783.332</b>	<b>1.983.332</b>	
	Unaprijeđenje prikupljanja komunalnog otpada u Kantonu Sarajevo	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	<b>12.070.000</b>		<b>237.085</b>	<b>237.085</b>	<b>237.085</b>		<b>3.452.915</b>	<b>4.250.000</b>	<b>4.130.000</b>	
	Unaprijeđenje odlaganja otpada na sanitarnoj deponiji „Smiljevići“	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	<b>22.939.000</b>		<b>231.445</b>	<b>231.445</b>	<b>231.445</b>		<b>18.418.055</b>	<b>490.000</b>	<b>3.799.500</b>	
	Zamjena mjerača protoka gasa (II faza)	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	<b>6.500.000</b>	<b>1.600.000</b>			<b>1.600.000</b>		<b>2.400.000</b>	<b>2.500.000</b>		
	<b>UKUPNO</b>				<b>164.615.920</b>	<b>42.015.727</b>	<b>30.837.086</b>	<b>22.363.048</b>	<b>64.378.775</b>		<b>58.438.498</b>	<b>17.491.128</b>	<b>15.833.481</b>	
Ministarstvo saobraćaja	Javna podzemna garaža G-3 u ulici Kolodvorska u Sarajevu	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	5.000.000	86.585	3.763.415	2.707.781	2.794.366		250.000	450.000	450.000	
			Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000					
	<b>Ukupno</b>				<b>7.000.000</b>	<b>86.585</b>	<b>5.763.415</b>	<b>4.707.781</b>	<b>4.794.366</b>		<b>250.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	
	Projekat izgradnje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	<b>12.164.330</b>	<b>4.611.288</b>	<b>2.503.777</b>	<b>1.344.523</b>	<b>5.955.811</b>		<b>5.049.265</b>			
	Projekat obnove voznog parka tramvajskog saobraćaja	Ino sredstva	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Kredit	<b>110.000.000</b>		<b>19.362.717</b>	<b>19.362.717</b>	<b>19.362.717</b>		<b>45.318.642</b>	<b>45.318.641</b>		
	Projekat obnove voznog parka za javni linijski prijevoz putnika	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	4.776.685	3.959.264			3959264		817.421			
		Ino sredstva	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Kredit	53.000.000						53.000.000			
	<b>Ukupno</b>				<b>57.776.685</b>	<b>3.959.264</b>			<b>3959264</b>		<b>53.817.421</b>			
	Projekat sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	83.730	83.730			83730					
		Ino sredstva	Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	Kredit	60.656.297						15.552.099	15.552.099	29.552.099	

Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2022	2023	2024	Plan za naredni period
	<b>Ukupno</b>				<b>60.740.027</b>	<b>83.730</b>			<b>83730</b>		<b>15.552.099</b>	<b>15.552.099</b>	<b>29.552.099</b>	
	<b>UKUPNO</b>				<b>247.681.042</b>	<b>8.740.867</b>	<b>27.629.909</b>	<b>25.415.021</b>	<b>34.155.888</b>		<b>119.987.427</b>	<b>61.320.740</b>	<b>30.002.099</b>	
Ministarstvo unutrašnjih poslova	Dogradnja i adaptacija IV policijske uprave MUP-a KS, PS Novi Grad	Domaća sredstva	Budžet kantona - potrošačka jedinica	Budžet	489	489			489					
				Kredit	1.000.000		600.000	73.048	73.048		400.000			
	<b>Ukupno</b>				<b>1.000.489</b>	<b>489</b>	<b>600.000</b>	<b>73.048</b>	<b>73.537</b>		<b>400.000</b>			
	<b>UKUPNO</b>				<b>1.000.489</b>	<b>489</b>	<b>600.000</b>	<b>73.048</b>	<b>73.537</b>		<b>400.000</b>			
<b>UKUPNO</b>					<b>782.760.034</b>	<b>139.569.321</b>	<b>108.398.187</b>	<b>74.170.119</b>	<b>213.739.440</b>	<b>2.357.145</b>	<b>243.633.372</b>	<b>125.682.456</b>	<b>74.803.182</b>	<b>88.316.371</b>

Tabela 2. Pregled projekata u implementaciji Gradonačelnik Grada Sarajeva i općine, u KM

Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2022	2023	2024	Plan za naredni period		
Gradonačelnik Grada Sarajeva	Bistrički potok- Nastavak realizacije projekta Provođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije zacijevljenog Bistričkog potoka od ulazne građevine do mjesta ulijevanja u Miljacku (u d	Domaća sredstva	Budžet kantona - potrošačka jedinica	Budžet	750.000		100.000				250.000	200.000	200.000			
				Ostala domaća sredstva	Budžet	630.000		20.000	15.000	15.000		210.000	200.000	200.000		
				Kredit	80.000		40.000					40.000				
			<b>Ukupno</b>				<b>1.460.000</b>		<b>160.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		<b>500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	
	Iluminacija objekata od kulturno historijskog značaja za Grad Sarajevo	Domaća sredstva	Ostala domaća sredstva	Budžet	590.000	90.000	100.000	41.000	131.000			100.000	150.000	150.000		
				Kredit	50.000							50.000				
	<b>Ukupno</b>				<b>640.000</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>41.000</b>	<b>131.000</b>			<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
	Investicioni projekt: Kasarna Jajce - zaštita od daljeg propadanja i revitalizacija platoa Kasarne Jajce	Domaća sredstva	Ostala domaća sredstva	Kredit	31.000	31.000				31.000						
				Vlastita sredstva	1.050.000		50.000			950.000	50.000					
	<b>Ukupno</b>				<b>1.081.000</b>	<b>31.000</b>	<b>50.000</b>		<b>31.000</b>	<b>950.000</b>	<b>50.000</b>					
	Izgradnja biciklističke infrastrukture na području Grada Sarajeva - dionica III-VI transverzala	Domaća sredstva	Ostala domaća sredstva	Budžet	451.000	21.000	70.000	150.000	171.000			120.000	120.000	120.000		
				Kredit	60.000		30.000					30.000				
	<b>Ukupno</b>				<b>511.000</b>	<b>21.000</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>171.000</b>			<b>150.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>		
	Izvođenje radova na rekonstrukciji i rehabilitaciji zgrade Željezničke stanice na Bistriku	Domaća sredstva	Budžet FBiH - Sufinansiranje projekata	Grant	350.000	100.000	250.000			100.000						
Ostala domaća sredstva				Budžet	398.000	88.000	285.000	162.000	250.000		25.000					
			Kredit	2.000.000	1.372.000	628.000	628.000	2.000.000								
<b>Ukupno</b>				<b>2.748.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>1.163.000</b>	<b>790.000</b>	<b>2.350.000</b>			<b>25.000</b>					
Nastavak projekta rekonstrukcije, restauracije i kolorističke obnove fasada u Gradu Sarajevu	Domaća sredstva	Ostala domaća sredstva	Budžet	1.164.000	38.000	230.000	7.000	45.000			230.000	270.000	396.000			
Nastavak realizacije projekta Poslovni objekt Vidikovac s vanjskim uređenjem	Domaća sredstva	Javna preduzeća - vlastito učešće	Vlastita sredstva	1.600.000	1.600.000				1600000							
			Budžet	1.920.000	1.370.000	450.000	1.000	1.371.000		100.000						
		Ostala domaća sredstva	Kredit	3.000.000	3.000.000			3000000								
<b>Ukupno</b>				<b>6.520.000</b>	<b>5.970.000</b>	<b>450.000</b>	<b>1.000</b>	<b>5.971.000</b>			<b>100.000</b>					
Održavanje uređenog vodotoka rijeke Miljacke na području Grada Sarajeva	Domaća sredstva	Budžet kantona - potrošačka jedinica	Budžet	287.000	90.000	47.000		90.000			50.000	50.000	50.000			

Podnositelj	Naziv projekta	Vrsta finansiranja	Izvor finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2022	2023	2024	Plan za naredni period
			Ostala domaća sredstva	Budžet	942.000	440.000	202.000	150.000	590.000		100.000	100.000	100.000	
				Kredit	60.000		30.000				30.000			
			<b>Ukupno</b>		<b>1.289.000</b>	<b>530.000</b>	<b>279.000</b>	<b>150.000</b>	<b>680.000</b>		<b>180.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	
	Povećanje kapaciteta teretane i fitness centra zatvaranjem dijela terase objekta Olimpijski bazena "Otoka"	Domaća sredstva	Ostala domaća sredstva	Budžet	20.000	20.000			20.000					
				Kredit	630.000						630.000			
			<b>Ukupno</b>		<b>650.000</b>	<b>20.000</b>			<b>20.000</b>		<b>630.000</b>			
	Projekt izrade kanalizacionog sistema za potrebe gornje stanice Trebevičke žičare	Domaća sredstva	Ostala domaća sredstva	Budžet	1.287.000		187.000				400.000	300.000	400.000	
				Kredit	1.000.000		14.000	14.000	14.000		986.000			
			<b>Ukupno</b>		<b>2.287.000</b>		<b>201.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		<b>1.386.000</b>	<b>300.000</b>	<b>400.000</b>	
	Ramića potok- Provođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije zacijevljenog Ramića potoka od ulazne građevine do mjesta ulijevanja u Miljacku (u dužini cca 1,2km) i realizacija sanacij	Domaća sredstva	Budžet kantona - potrošačka jedinica	Budžet	200.000							200.000		
			Ostala domaća sredstva	Budžet	131.000	21.000	10.000		21.000			100.000		
				Kredit	80.000		40.000				40.000			
			<b>Ukupno</b>		<b>411.000</b>	<b>21.000</b>	<b>50.000</b>		<b>21.000</b>		<b>40.000</b>	<b>300.000</b>		
	Rekonstrukcija i adaptacija poslovne zgrade SDK (kod "Vječne vatre)	Domaća sredstva	Ostala domaća sredstva	Budžet	11.906.000		210.000	91.000	91.000	11.329.000	367.000			
				Kredit	2.605.000						2.605.000			
			<b>Ukupno</b>		<b>14.511.000</b>		<b>210.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>11.329.000</b>	<b>2.972.000</b>			
			<b>UKUPNO</b>		<b>33.272.000</b>	<b>8.281.000</b>	<b>2.993.000</b>	<b>1.259.000</b>	<b>9.540.000</b>	<b>12.279.000</b>	<b>6.413.000</b>	<b>1.690.000</b>	<b>1.616.000</b>	
Općina Novo Sarajevo	Izgradnja kanalizacionih i vodovodnih mreža u ulici Pofalička	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	740.000						740.000			
			Općina budžet	Budžet	200.000		20.000	8.000	8.000		180.000			
			<b>Ukupno</b>		<b>940.000</b>		<b>20.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		<b>920.000</b>			
	Izgradnja sportsko rekreativne zone Velešići na prostoru bivšeg Strelišta	Domaća sredstva	Budžet kantona - sufinansiranje	Budžet	4.000.000						1.000.000	1.000.000	2.000.000	
			Općina budžet	Budžet	2.000.000		145.000	143.000	143.000		355.000	500.000	1.000.000	
			<b>Ukupno</b>		<b>6.000.000</b>		<b>145.000</b>	<b>143.000</b>	<b>143.000</b>		<b>1.355.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	
			<b>UKUPNO</b>		<b>6.940.000</b>		<b>165.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>		<b>2.275.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	
Općina Stari Grad	Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže u dijelu ulica Kamenica-Paje	Domaća sredstva	Općina budžet	Budžet	558.009	227.820	227.820	227.820	455.640		102.369			
Općina Trnovo	Izgradnja Poslovno-Sportskog centra Trnovo	Domaća sredstva	Budžet općine - sufinansiranje	Budžet	23.000.000	3.000.000	5.000.000	3.000.000	6.000.000	2.000.000	5.000.000	6.000.000	2.000.000	
	Izgradnja garaže na Babinom dolu - Bjelašnica	Domaća sredstva	Budžet kantona - javne investicije	Budžet	2.215.000	700.000	700.000	350.000	1.050.000		815.000			
			Budžet općine - sufinansiranje	Budžet										
			<b>Ukupno</b>		<b>2.215.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>350.000</b>	<b>1.050.000</b>		<b>815.000</b>			
			<b>UKUPNO</b>		<b>25.215.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>5.700.000</b>	<b>3.350.000</b>	<b>7.050.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>5.815.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	
			<b>UKUPNO</b>		<b>65.985.009</b>	<b>12.208.820</b>	<b>9.085.820</b>	<b>4.987.820</b>	<b>17.196.640</b>	<b>14.279.000</b>	<b>14.605.369</b>	<b>9.190.000</b>	<b>6.616.000</b>	

Projekti koji su u cijelosti završeni u investicionom periodu su:

1. Nastavak obnove objekta Olimpijskog muzeja u Sarajevu (Vila Mandić, Petrakijina ulica)
2. Rekonstrukcija Muzeja Vijećnica
3. Regulacija, uređenje i čišćenje vodotoka na području općine Ilidža
4. Izgradnja, rekonstrukcija/rehabilitacija, asfaltiranje i održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta
5. Podrška mladima za pokretanje start up poslovnih subjekata na području KS u 2021. godini
6. Izgradnja objekta za smještaj KJU "Porodično savjetovalište" KS
7. Izgradnja osnovne škole na Aneksu
8. Izgradnja osnovne škole u Hadžićima
9. Energetska efikasnost u BiH-rekonstrukcija objekata škole OŠ "Isak Samokovlija" Sarajevo
10. Sufinansiranje izgradnje i opremanja sale za tjelesni odgoj u JU SC "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš
11. Sufinansiranje izgradnje i opremanja sale za tjelesni odgoj u JU OŠ „Dobroševići“
12. Sufinansiranje izgradnje sale za tjelesni odgoj u JU OŠ „Hašim Spahić“
13. Sufinansiranje izgradnje i opremanja sale za tjelesni odgoj u JU Sedma osnovna škola
14. Sufinansiranje dogradnje JU OŠ „Zaim Kolar“ – škola u prirodi, Šabići
15. Izgradnja i opremanje objekta nove sportske sale u OŠ "Umihana Čuvidina"
16. Rekonstrukcija vrtića "Bulbuli"
17. Rekonstrukcija vrtića "Razigrani dani"
18. Rekonstrukcija i opremanje objekta vrtića "Vjeverica"


## 2. Projekti prema strukturi i načinu finansiranja

Od ukupne realizacije projekata 230.936.080 KM realizovano je domaćih sredstava 189.033.207 KM (81,9%), a ino sredstava 41.902.873 (18,1%).

Tabela 3. Pregled ulaganja u projekte u implementaciji po strukturi finansiranja, u KM

Vrsta finansiranja	Način finansiranja	Ukupna vrijednost	Utrošeno u prethodnim godinama	Plan za tekuću godinu	Utrošeno u tekućoj godini	Ukupno realizovano	Nedostajuća sredstva	2022	2023	2024	Plan za naredni period
Domaća sredstva	Budžet	443.709.728	114.779.889	61.482.666	33.470.464	148.250.353	15.279.000	105.452.682	56.942.037	41.457.083	48.316.371
	Grant	12.783.167	6.245.667	634.500	65.829	6.311.496		2.803.000	2.800.000	300.000	
	Kredit	54.499.291	20.814.261	15.170.017	8.855.135	29.669.396		16.715.013	1.800.000		
	Vlastita sredstva	6.985.378	4.646.634	402.950	155.328	4.801.962	1.357.145	318.649	150.000	110.000	
<b>Ukupno</b>		<b>517.977.564</b>	<b>146.486.451</b>	<b>77.690.133</b>	<b>42.546.756</b>	<b>189.033.207</b>	<b>16.636.145</b>	<b>125.289.344</b>	<b>61.692.037</b>	<b>41.867.083</b>	<b>48.316.371</b>
Ino sredstva	Grant	9.987.537	3.814.685	1.471.915	26.001	3.840.686		3.955.922	745.015		
	Kredit	320.779.942	1.477.005	38.321.959	36.585.182	38.062.187		128.993.475	72.435.404	39.552.099	40.000.000
<b>Ukupno</b>		<b>330.767.479</b>	<b>5.291.690</b>	<b>39.793.874</b>	<b>36.611.183</b>	<b>41.902.873</b>		<b>132.949.397</b>	<b>73.180.419</b>	<b>39.552.099</b>	<b>40.000.000</b>
<b>UKUPNO</b>		<b>848.745.043</b>	<b>151.778.141</b>	<b>117.484.007</b>	<b>79.157.939</b>	<b>230.936.080</b>	<b>16.636.145</b>	<b>258.238.741</b>	<b>134.872.456</b>	<b>81.419.182</b>	<b>88.316.371</b>

Učešće domaćih i ino sredstava u ukupnoj realizaciji i učešće domaćih i ino sredstava u realizaciji u 2021. godini

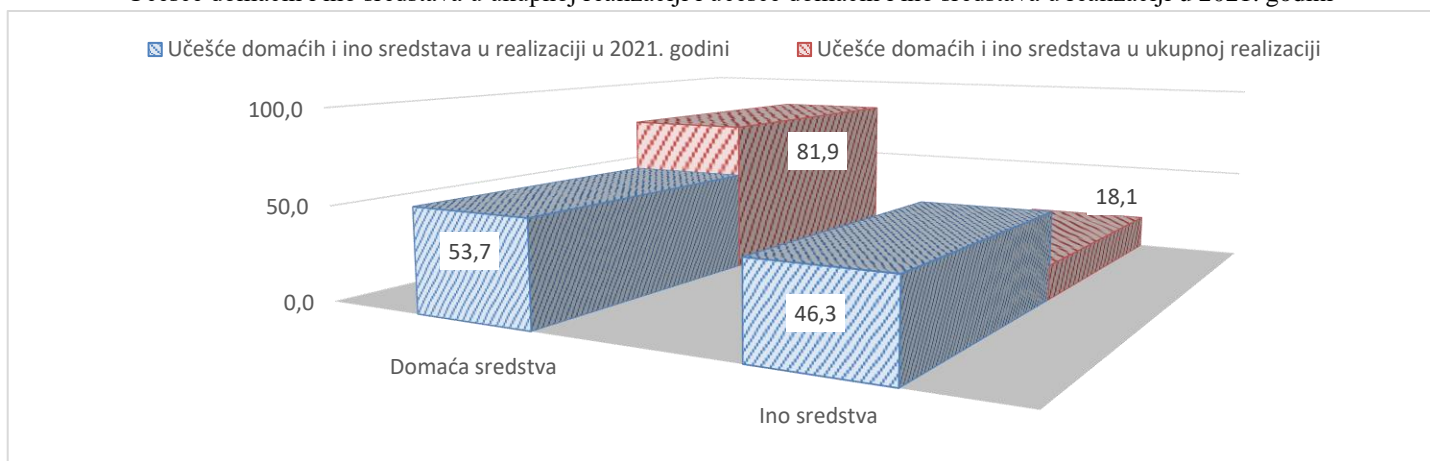

U 2021. godini od ukupne realizacije projekata 79.157.939 KM realizovano je domaćih sredstava 42.546.756 KM (53,7%) i ino sredstava 36.611.183 KM (46,3%).

## Zaključak

Od vrijednosti projekata u implementaciji 782.760.034 KM u investicionom periodu realizovano je 213.739.440 KM ili 27,3%.

Za 2021. godinu planirana je realizacija u vrijednosti od 108.398.187 KM projekata u implementaciji, od čega je na dan 31.12.2021. godine realizovano 74.170.119 KM ili 68,4%.

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS ima najveći stepen realizacije projekata u investicionom periodu, gdje je od ukupne vrijednosti 164.615.920 KM realizovano 64.378.775 KM ili 39,1%. No, od planirane vrijednosti za 2021. godinu 30.837.086 KM, a na dan 31.12.2021. godine realizovano je 22.363.048 KM ili 72,5%.

Ministarstvo saobraćaja KS bilježe najveći iznos realizacije na dan 31.12.2021. godine 25.415.021 ili 92% od planirane vrijednosti za 2021. godinu u iznosu od 27.629.909 KM.

Projekti koji su u cjelosti završeni u investicionom periodu su:

1. Nastavak obnove objekta Olimpijskog muzeja u Sarajevu (Vila Mandić, Petrakijina ulica)
2. Rekonstrukcija Muzeja Vijećnica
3. Regulacija, uređenje i čišćenje vodotoka na području općine Ilidža
4. Izgradnja, rekonstrukcija/rehabilitacija, asfaltiranje i održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta
5. Podrška mladima za pokretanje start up poslovnih subjekata na području KS u 2021. godini
6. Izgradnja objekta za smještaj KJU "Porodično savjetovište" KS
7. Izgradnja osnovne škole na Aneksu
8. Izgradnja osnovne škole u Hadžićima
9. Energetska efikasnost u BiH-rekonstrukcija objekata škole OŠ "Isak Samokovlija" Sarajevo
10. Sufinansiranje izgradnje i opremanja sale za tjelesni odgoj u JU SC "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš
11. Sufinansiranje izgradnje i opremanja sale za tjelesni odgoj u JU OŠ „Dobroševići“
12. Sufinansiranje izgradnje sale za tjelesni odgoj u JU OŠ „Hašim Spahić“
13. Sufinansiranje izgradnje i opremanja sale za tjelesni odgoj u JU Sedma osnovna škola
14. Sufinansiranje dogradnje JU OŠ „Zaim Kolar“ – škola u prirodi, Šabići
15. Izgradnja i opremanje objekta nove sportske sale u OŠ "Umihana Čuvidina"
16. Rekonstrukcija vrtića "Bulbuli"
17. Rekonstrukcija vrtića "Razigrani dani"
18. Rekonstrukcija i opremanje objekta vrtića "Vjeverica"

Za sljedeće projekte su odobrena sredstva, ali nisu počeli sa realizacijom:

1. Projekat energetske efikasnosti – objekat K020 bivša Fizijatrija (Klinički centar Univerziteta u Sarajevu; Ministarstvo zdravstva)

2. Projekat energetske efikasnosti - Objekat K007 Traumatologija (KUM) (Klinički centar Univerziteta u Sarajevu; Ministarstvo zdravstva)
3. Izgradnja dječijeg snježnog parka na Bjelašnica i Igmanu (KJP ZOI '84 Sarajevo; Ministarstvo privrede)
4. Izgradnja i modernizacija parking sistema, video nadzora i SKIDATE (KJP ZOI '84 Sarajevo; Ministarstvo privrede)
5. Nabavka novih radnih mašina za uređenje staza (KJP ZOI '84 Sarajevo; Ministarstvo privrede)
6. Izgradnja novog vertikalnog transporta i remont postojećeg sistema Bx na Bjelašnici (KJP ZOI '84 Sarajevo; Ministarstvo privrede)
7. Povećanje kapaciteta za prevoz putnika – izgradnja tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica (Ministarstvo saobraćaja)
8. Projekat izgradnje trolejbuske kontaktne mreže i elektrovučnih podstanica potrebnih za uspostavljanje trolejbuskog saobraćaja do Vogošće (Ministarstvo saobraćaja)
9. Povećanje bezbjednosti građana i smanjenje kriminaliteta na području Kantona Sarajevo moderniziranjem infrastrukturnih i operativnih kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije Kantona Sarajevo - prva faza (Ministarstvo unutrašnjih poslova KS)

Osim toga, postoje projekti koji su u implementaciji, a nisu imali realizacije u 2021. godini:

1. Izgradnja i rekonstrukcija Južne longitudinalne – Dionica II (od IV do X transverzale; km 2+580,150 do 5+616,20) do 5+616,20) - Direkcija za puteve Kantona Sarajevo
2. Modernizacija sistema urbanih saobraćajnica u Kantonu Sarajevo izgradnjom i rekonstrukcijom Južne longitudinalne – dionica: od II do IV transverzale - Direkcija za puteve Kantona Sarajevo
3. Izgradnja kompleksa "Šehidsko spomen mezarje Kovači" Sarajevo - Ministarstvo za boračka pitanja
4. Rekonstrukcija objekta Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo i specifikacija potrebne opreme; Ministarstvo zdravstva
5. Rekonstrukcija i sanacija centralnog objekta JU zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo - JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS; Ministarstvo zdravstva
6. Zamjena mjerača protoka gasa (II faza); Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
7. Predinvestiranje u rješ. imov-pravnih odnosa i izgradnje primarne materijalne infr. za pokretanje kolektivne i individualne stambene izg. u skla. sa usvojenim pros.plan na području KS; Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
8. Projekat opremanja prihvatilišta pasa lualica; Ministarstvo privrede
9. Izgradnja automatske garaže za sestosjed i zatvaranje dolazne stanice; Ministarstvo privrede
10. Izgradnja novog vertikalnog transporta (žičara) i rekonstrukcija postojećeg sistema na Bjelašnici i Igmanu; Ministarstvo privrede
11. Sanacija piste za brzo klizanje na Zetri druga i treća faza; Ministarstvo privrede



12. Projekat sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu; Ministarstvo saobraćaja
13. Nabavka opreme za realizaciju Projekta „Elektronski dnevnik“; Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
14. Projekat energetske efikasnosti uobrazovnim objektima na području Kantona Sarajevo; Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
15. Sufinansiranje izgradnje osnovne škole na Šipu; Ministarstvo za odgoj i obrazovanje
16. Investicioni projekt: Kasarna Jajce - zaštita od daljeg propadanja i revitalizacija platoa Kasarne Jajce; Grad Sarajevo
17. Povećanje kapaciteta teretane i fitness centra zatvaranjem dijela terase objekta Olimpijski bazena "Otoka"; Grad Sarajevo
18. Ramića potok- Provođenje istražnih radova i izrada Glavnog projekta sanacije zacijevljenog Ramića potoka od ulazne građevine do mjesta ulijevanja u Miljacku (u dužini cca 1,2km) i realizacija sanacije; Grad Sarajevo

Posebno treba istaći da je implementacija mnogih projekata vezana za zahtjevne procedure javnih nabavki. Praktično takvi projekti nemaju finansijsku realizaciju, ali su se počeli implementirati.

Od ukupne realizacije projekata 230.936.080 KM realizovano je domaćih sredstava 189.033.207 KM (81,9%), a ino sredstava 41.902.873 (18,1%).
